



Politisk følgegruppe

18. december 2024

Dagsorden:

1. Nyt fra skadesstedet

v. Projektleder Camilla Sieg

2. Juridiske forhold

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

3. Tidslinje for det videre arbejde

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

4. Den fremtidige organisering

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe i 2025

v. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

6. Eventuelt

- Kort orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse v. Borgerrådgiver Jesper Cortes



1. Nyt fra skadestedet

v. Camilla Sieg



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 18. december 2024

Alling Å - status

Alling Å løber fortsat fint i det nye tracé, og er helt færdig.

Processen omkring sugespidserne trækker lidt ud, da bunden ikke må flytte sig.



Bassiner

Status:

Bassin 14 er oprenset og færdig

Bassin 122 er samlet og færdig

Bassin 101 bliver færdig indeværende uge, pumpebrønden er sat

Bassin 102 er færdig, godkendt og ibrugtaget

Bassin 120 er færdig

Bassin 21 bliver færdig indeværende uge



Bassin 102




Bassin 21

Vejprojekt for Gl. Århusvej

Vejprojektet udbydes til januar med forventet opstart i uge 8. Dette afhænger dog af vejret.


Som tidligere fortalt ligger Gl. Århusvej på sætningsgivende lag, vejen vil derfor sætte sig. Slidlaget afventer derfor til 2026.

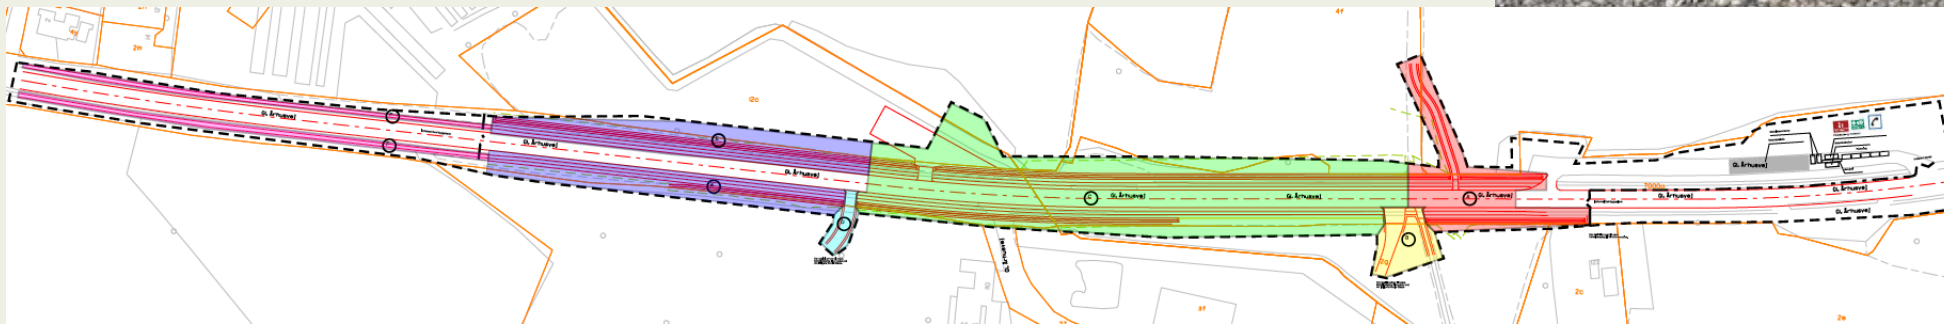

RO-anlæg og bygning hertil

RO-anlægget er genudbudt, der er indkommet priser d. 16. december 2024. Det økonomisk mest fordelagtige tilbud kommer fra BWT, og evalueringen udsendes til de bydende i dag.

De ydre dimensioner på bygningen til renseanlægget er fastlagt, og der er ved at være styr på de nødvendige tilladelser. Forventet opstart af byggeriet er januar 2025.

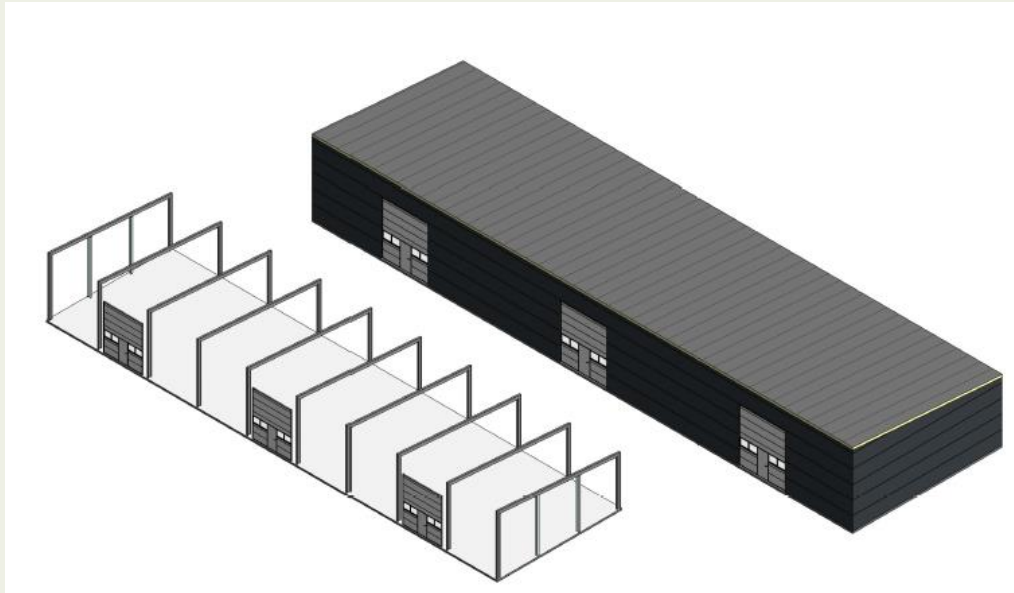

Gravning efter boring

Boringen er fundet, og der er taget vandprøver for at vurdere vandkvaliteten. Resultatet af vandprøverne forventes først i det nye år.

Afhængig af resultatet skal boringen skylles/ renses og derefter lukkes.



RANDERS



PFAS jorden



PFAS

Forholdene har endnu ikke været til at bore efter PFAS jorden.

Det er en større borerig, som skal rekvireres, og den kræver en kørevej med køreplader. Dette er ikke muligt at etablere på nuværende tidspunkt.

Det vurderes, at jorden ikke udgør en miljørisiko.

Spuns og rørledninger

Spunsen ved E45 er klar til at blive trukket, og kan trækkes i uge 2, 2025.

Spunsen har ikke længere en funktion, da der ikke er mere er risiko for forurening af Alling Å.



Rørledningerne, som var indlejede, er samlet sammen, og de sidste er hentet fra pladsen.

Rammeudbud og nedlukning af pladsen



Rammeudbud

Team Svanholm ApS har vundet rammeudbuddet vedrørende akutberedskab ved skadesstedet. Kontrakten træder i kraft d. 20. december 2024.

Nedlukning af pladsen

Alle maskiner og materiel er afmeldt til d. 20. december, og de sidste skurvogne afhentes denne dag.



2. Juridiske forhold

v. Jesper Kaas Schmidt

Juridiske spørgsmål 1

Status på DSH Recycling A/S u/konkurs:

- DSH Recycling A/S er gået konkurs den 19. november 2024.
- Kuratellet består af:
 - Anders Hoffmann, Bech-Bruun
 - Harald Søndergaard, Hafnia Law
 - Boris Frederiksen, Kammeradvokaten
- Der er den 16. december 2024 afholdt møde mellem kommunen og Anders Hoffmann, Bech-Bruun, der repræsenterer kommunen i kuratellet.
- Konkursboet efter DSH fastholder retssagen mod Randers Kommune.



Juridiske spørgsmål 2

Status på DSH Recycling A/S u/konkurs fortsat:

- Konkursboet efter Nordic Waste A/S har onsdag rejst et foreløbigt krav på cirka 500 millioner kroner mod ledelsesmedlemmer i selskabet samt søsterselskabet DSH Recycling A/S, der ligeledes er gået konkurs.
- Konkursboet består primært af to ejendomme, indeståender, eventuelle forsikringsudbetalinger samt nogle få, mindre debitorer.
- Tidspunkt for konkursboets afslutning afhænger primært af, hvornår ejendommen Gl. Aarhusvej 110 (NW-grunden) kan sælges.





Dialog med Regionen

Håndtering af Forurenede jord i Råstofgraven

- Nordic Waste har efterladt flere jordbunker i råstofgraven, som der ikke er tilladelse til.
- I forbindelse med jordskredet er der på hele arealet blandet mikrofiller ind i jorden i råstofgravområdet.
- Begge forhold udgør ikke en akut trussel mod Alling Å og er derfor ikke omfattet af Randers Kommunes afværgeindsats, men bidrager til at overfladevandet, som renses i dag, bliver forurenede.
- Afklaringen af omfanget af forureningen herfra skal afklares af den relevante myndighed.
- Regionen er myndighed for råstofgraven og myndighed for den offentlige indsats i forhold til forurenede grunde.
- Randers Kommune og Regionen er derfor i dialog omkring myndighedsforpligtigheden. Der er juridisk uenighed herom.
- Randers Kommune og vores advokat vurderer, at myndighedsforpligtigheden ligger hos regionen. Regionens juridiske rådgivning vurderer, at myndighedsforpligtigheden ligger hos Randers Kommune.
- Der har været afholdt møde mellem de tidknyttede advokater. Dette har ikke ført til enighed endnu.
- Spørgsmålet rejses overfor MST mhp. på vejledning



Dialog med Regionen

Miljøgodkendelse til Vandhåndtering

- Udkast til miljøgodkendelse af vandhåndteringsanlægget godkendt af byrådet, er i høring hos Regionen i deres egenskab af råstofmyndighed.
- Der afholdes møde i januar 2025 for at sikre, at regionens myndighedsbemærkning bliver integreret i miljøgodkendelsen inden den meddeles endeligt.

Dialog med Favrskov Kommune



3. Tidslinje for det videre arbejde

v. Jesper Kaas Schmidt



Det videre forløb ved skadestedet

2024

- Pladsen nedlukkes i indeværende uge. Materiel og skurvogne bortkøres
- Rammeaftalen for akutberedskab træder i kraft.

2025 (1. og 2. kvartal)

- Gl. Århusvej er færdig og åbnet
- Alle bassiner oprenset og reableret
- Renseanlæg og bygning er etableret og idriftssat
- Arealer benyttet i forbindelse med overpumpning af Alling Å er reableret

2025, 3. kvartal og fremover

- Herefter overgår pladsen til en driftssituation



4. Den fremtidige organisering

v. Jesper Kaas Schmidt

Organisering

- Camilla Sieg er projektchef frem til 1. juni med 10 timer ugentligt. Camilla Sieg refererer i denne perioden til Jesper Kaas Schmidt.
- Johnni Hald er skadestedsleder frem til 1. juni og refererer i denne periode til Camilla Sieg.
- Fra 1. juni er Johnni Hald skadestedschef – Johnni Hald refererer herfra til Jesper Kaas Schmidt.
- Den nedsatte styregruppe med MST og Favrskov Kommune er stoppet med udgangen af december.



5. Fremtidige møder i den politiske følgegruppe 2025

v. Jesper Kaas Schmidt

Møder 2025

Foreløbigt planlagte møder:

- 28. januar
- 27. februar
- 25. marts
- 23. april

Alle møder afholdes kl. 16.00

Møderne er indkaldt i kalenderen.



6. Eventuelt

Eventuelt

Kort orientering om den videre proces med byrådets undersøgelse

v. Borgerrådgiver Jesper Cortes
